


نمایی از بلوک B و C



گزارش هفتگی از ۱۰ تا ۱۶
دی ماه

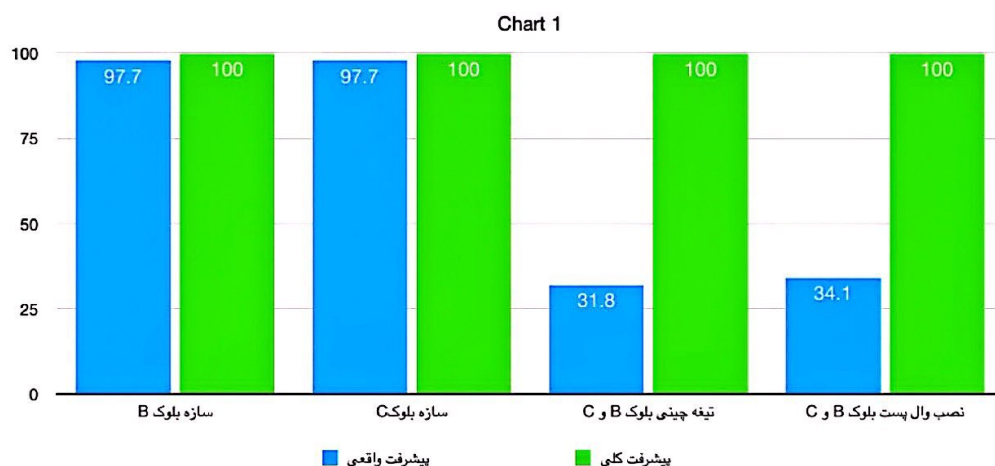

نمودار پیشرفت هفتگی از تاریخ ۱۰ الی ۱۶ دی ماه

	پیشرفت واقعی	پیشرفت کلی
سازه بلوک B	97.7	100
سازه بلوک C	97.7	100
تیغه چینی بلوک B و C	31.8	100
نصب وال پست بلوک B و C	34.1	100



پیشرفت هفتگی از ۱۰ الی ۱۶ دی ماه

کنسول های اجرا شده بلوک B



پیشرفت هفتگی از ۱۰ تا ۱۶
دی ماه

کنسول های اجرا شده بلوک C

پیشرفت هفتگی از ۱۰ تا ۱۶
دی ماه

بتن ریزی کنسول طبقه ۴ بلوک B



پیشرفت هفتگی از ۱۰ تا ۱۶
دی ماه

کنسول اجرا شده طبقه سوم بلوک C



پیشرفت هفتگی از ۱۰ تا ۱۶
دی ماه


اجرای کنسول طبقه ۴ بلوک C



پیشرفت هفتگی از ۱۰ تا ۱۶
دی ماه


تیغه چینی در طبقه ۸ بلوک

B

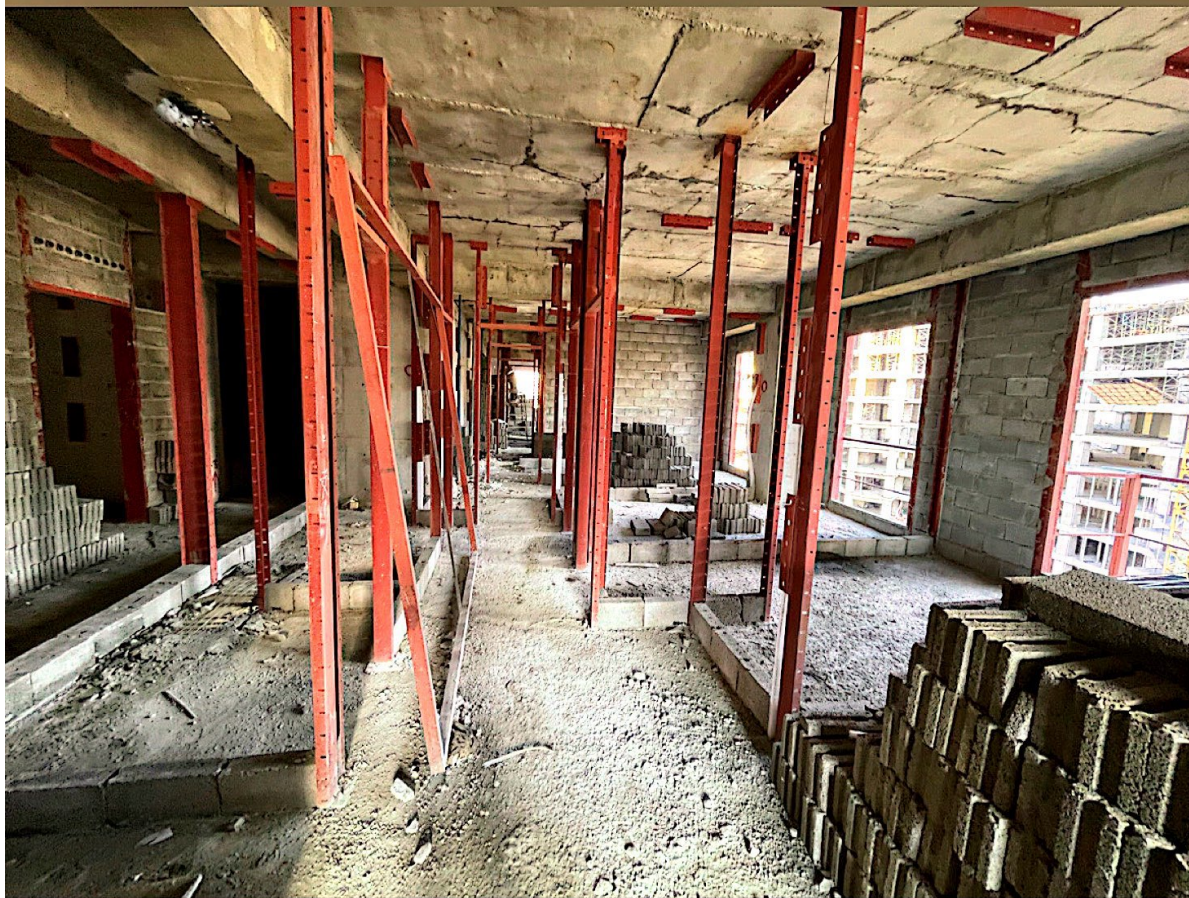

پیشرفت هفتگی از ۱۰ تا ۱۶
دی ماه

اجرای وال پست طبقه ۹ بلوک B

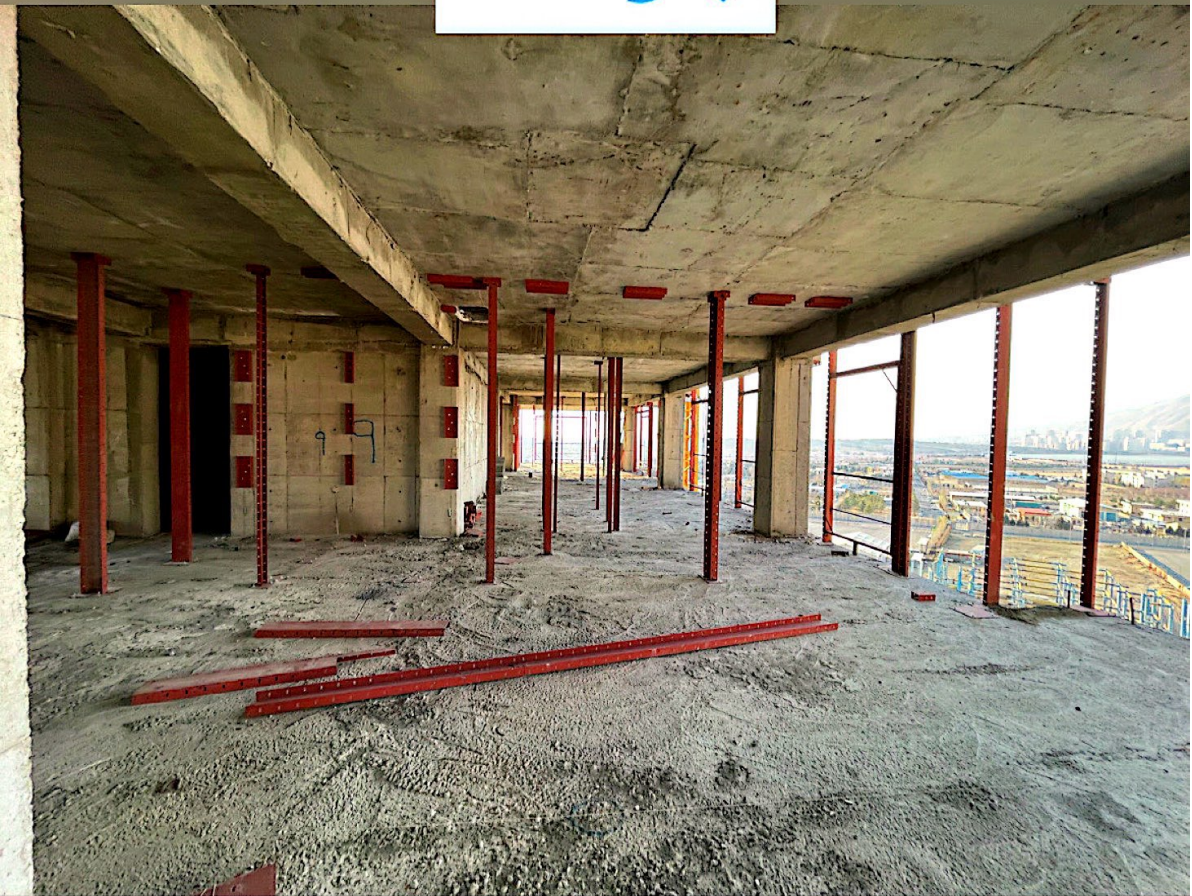


پیشرفت هفتگی از ۱۰ تا ۱۶
دی ماه

نصب پلست وال پست در طبقه ۱۲ بلوک C



پیشرفت هفتگی از ۱۰ تا ۱۶
دی ماه

وال پست اجرا شده و انتقال بلوک در طبقه ۱۱ بلوک C

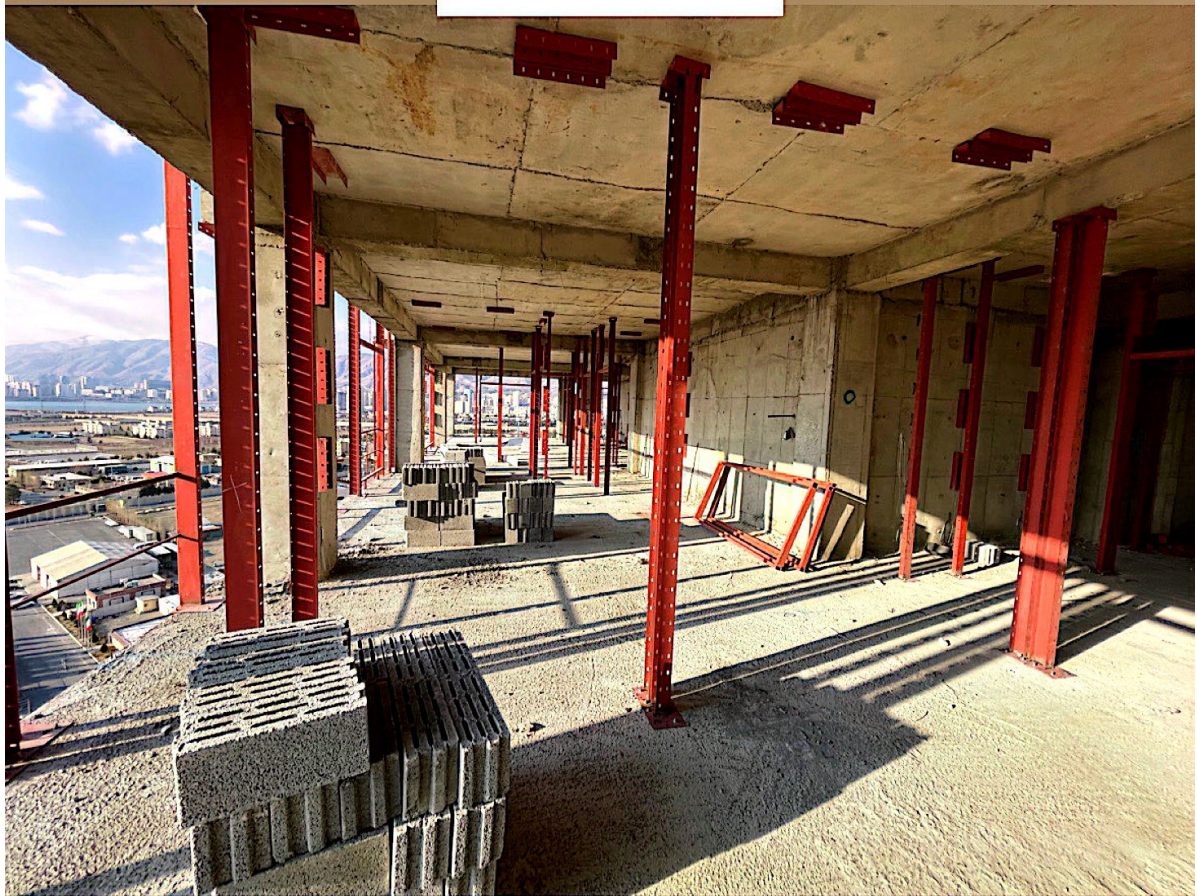

پیشرفت هفتگی از ۱۰ تا ۱۶
دی ماه

تیغه چینی طبقه ۱۱ بلوک C



پیشرفت هفتگی از ۱۰ تا ۱۶
دی ماه

اتمام تیغه چینی و نظافت طبقه ۱۰ بلوک C




پیشرفت هفتگی از ۱۰ تا ۱۶
دی ماه

**درب قسمت بارانداز
آسانسور کارگاهی (حفاظ
ایمنی)**



**پیشرفت هفتگی از ۱۰ تا ۱۶
دی ماه**

پوشش ضد زنگ پلیت های مورد نیاز وال پست

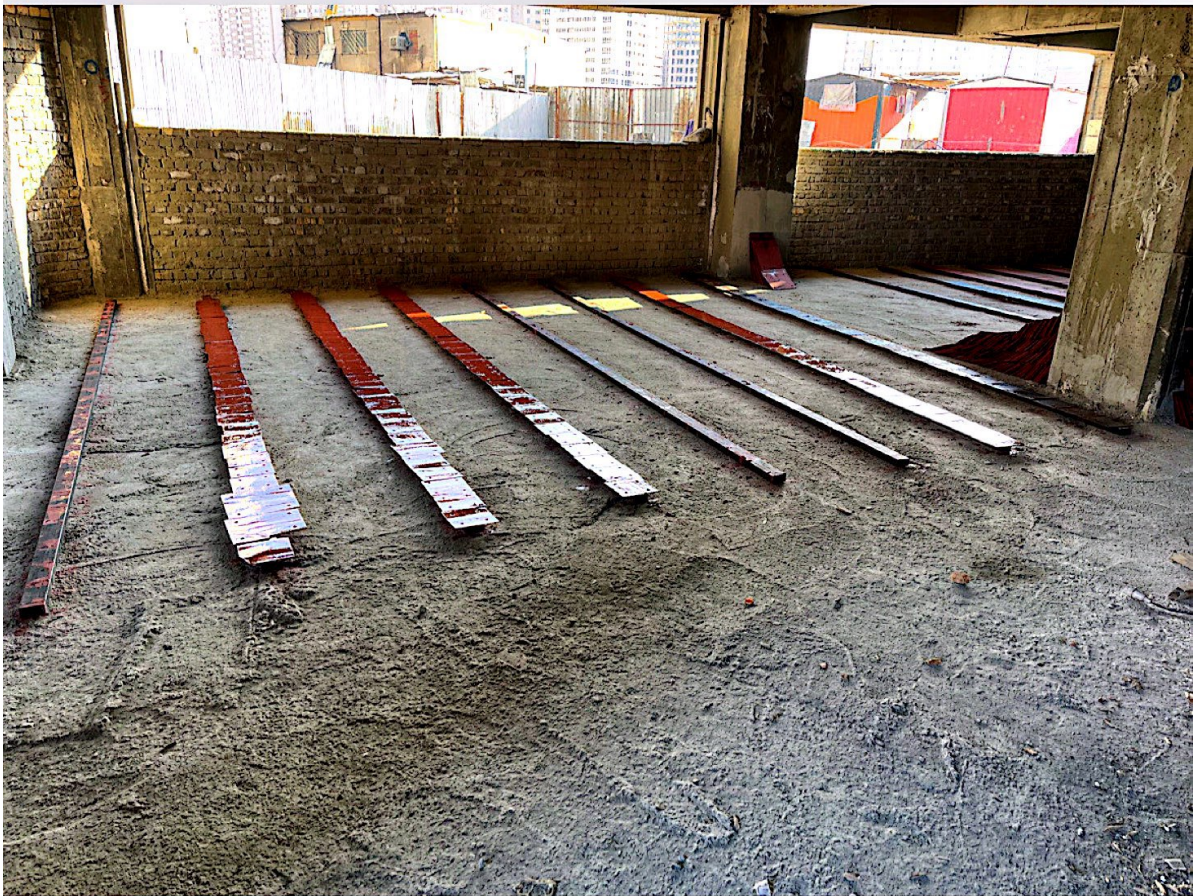

پیشرفت هفتگی از ۱۰ تا ۱۶
دی ماه
