



جدول پیشرفت فیزیکی عملیات اجرای درحال حاضر

شرح عملیات اجرایی	درصد پیشرفت
کاشیکاری سرویسها	87
کاشیکاری آشپزخانه	40
ایزو لایمپون سرویس ها	90
شاسی سقف کاذب طبقات مسکونی	68
سنگ کف واحدها	40
لوله کشی ابرسانی	95
لوله کشی و نصب فن کویل	96
لوله کشی فاضلاب	95
لوله کشی آتشنشانی(اسپرینگر)	92
نصب شیر آلات توکار	90
لوله کشی و فوطی گذاری	82
سیم کشی داخل واحد ها	45
مونورخانه	90
اجرای سنگ بالکن	65
شاسی کشی آسانسور بلوک B	66
شاسی کشی آسانسور بلوک C	66
سیمانکاری نما - استر	78
سیمانکاری نما - رویه	16
لوله کشی گاز	93
شاسی سقف کاذب پارکینگ	60
سالن اجتماعات	57

پروژه مسکونی بانک ملی ایران

مدیر طرح و پیمان شرکت تهویه آفرین سامان

پیشرفت فیزیکی تا ۳۰ شهریور ماه

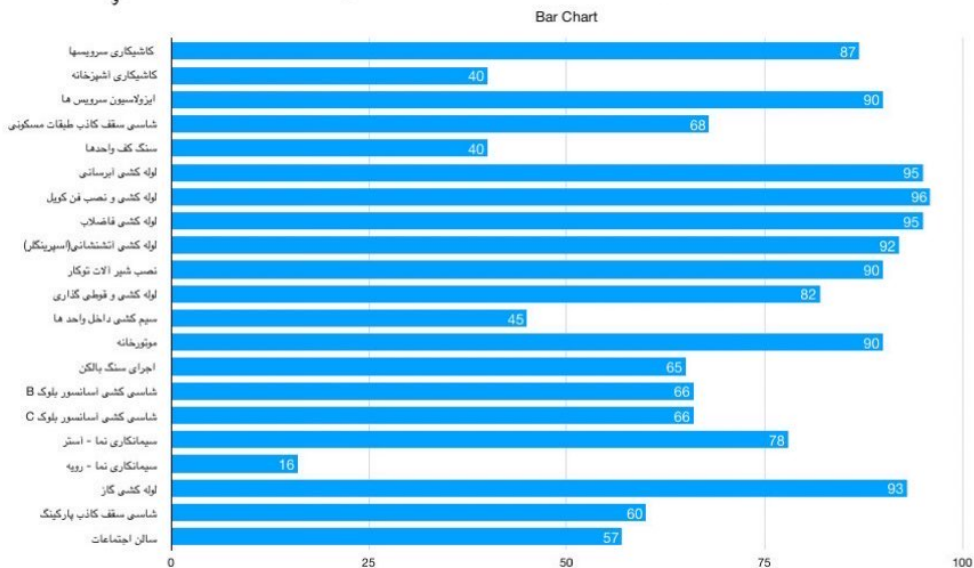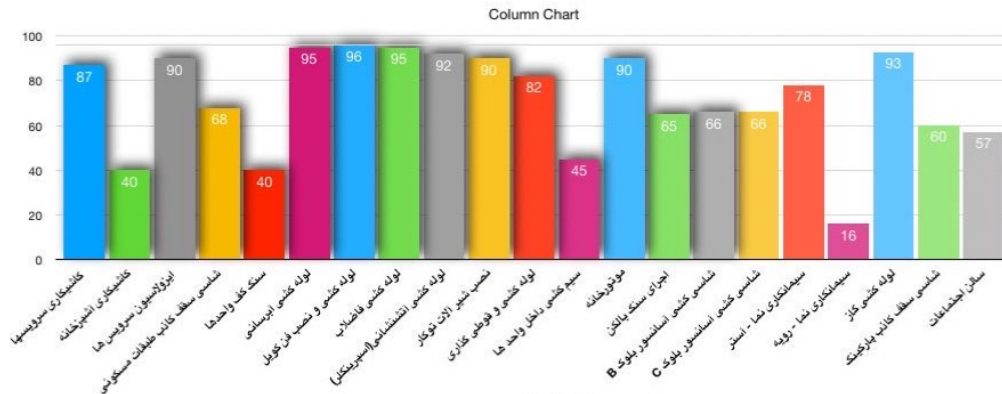

تیغه چینی طبقه ۱۶ بلوک B



جوشکاری شاسی آسانسور بلوک B




اجرای وال پست طبقه ۱۶ بلوک *B*



اجرای سقف کاذب سالن اجتماعات



اجرای کاشی کاری آشپزخانه طبقه سوم بلوک C

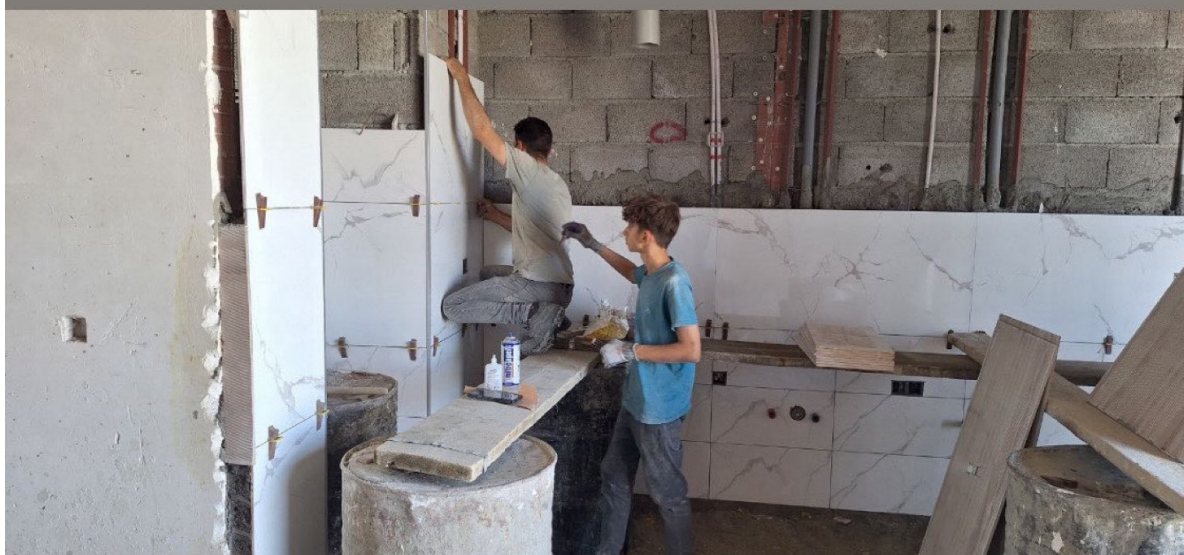

اجرای سنگ بدنه راهرو ارتباطی پارکینگ



اجرای سنگ اسلب کف طبقه دوم بلوک C



اجرای کاشی کاری آشپزخانه طبقه دوم بلوک C



اجرای سیمانکاری رویه انباری ها



اجرای سازه سقف کاذب کناف طبقه ۳ -



اجرای سقف کاذب طبقه ۳ - بلوک C



اجرای کاشی کاری آشپزخانه طبقه چهارم بلوک C



ایزولاسیون آشپزخانه طبقه ۵ و ۶ بلوک C



تست ایزولاسیون آشپزخانه ها



جوشکاری شاسی کشی آسانسور بلوک C



سیم کشی طبقه سوم بلوک C



اجرای کاشی آشپزخانه طبقه ۴ بلوک C



شیب بندی و آماده سازی کف طبقه ۱ - جهت ایزولاسیون



اجرای سنگ کف راهرو ارتباطی پارکینگ



نصب دمپرهای سیستم تخلیه دود و هوای تازه پارکینگ ها



اجرای سقف کاذب راه پله ها



شيب بندى پارکينگ ۱ - جهت ايزولاسيون



اجرای کاشی آشپزخانه طبقه ۳ بلوک B



جوشکاری شاسی آسانسور



اجرای سنگ اسلب طبقه چهارم بلوک B



نصب شیر فلکه ها و تست نهایی طبقه ۵ بلوک C



اجرای سنگ اسلب طبقه سوم بلوک B



سیم کشی طبقه دوم بلوک C



کر گیری جهت عبور لوله های تاسیساتی طبقه ۱۶ بلوک B



کاشی کاری آشپزخانه طبقه ۴ بلوک B



حمل سنگ طبقه سوم بلوک C



کاشی کاری آشپزخانه طبقه ۵ بلوک C



تیغه چینی طبقه ۱۶ بلوک B



اجرای سنگ اسلب طبقه ۴ بلوک C



اجرای رابیتس روی ایزولاسیون آشپزخانه طبقه ۵ بلوک C



نصب دمپرهای سیستم تخلیه دود و هوای تازه پارکینگ ۱ -



عایق کاری لوله های تاسیساتی



اجرای سنگ اسلب طبقه سوم بلوک B



اتمام شیب بندی و شروع ایزولاسیون طبقه ۱ -



اتمام ایزولاسیون طبقه ۱ -



جوشکاری شاسی آسانسور بلوک B



اجرای کاشی آشپزخانه طبقه ۵ بلوک C



آماده سازی شاسی سقف
کاذب جهت نصب گچ برگ طبقه
۲ بلوک B



تست نهایی لوله های تاسیساتی طبقه ۵ -



سٲم كشي سالن اجتماعات



اجرای سنگ اسلب طبقه سوم بلوک C



ایزولاسیون طبقه ۱ -



اجرای سنگ کف طبقه ۱ -



گچکاری راهرو ارتباطی پارکینگ



اجرای سنگ اسلب طبقه سوم بلوک C



اجرای سنگ اسلب طبقه ۵ بلوک C




اجرای سنگ بدنه پارکینگ ۱ -



اجرای پلنیوم باکس فن کویل های سالن اجتماعات




سٲم كشي سالن اجتماعات

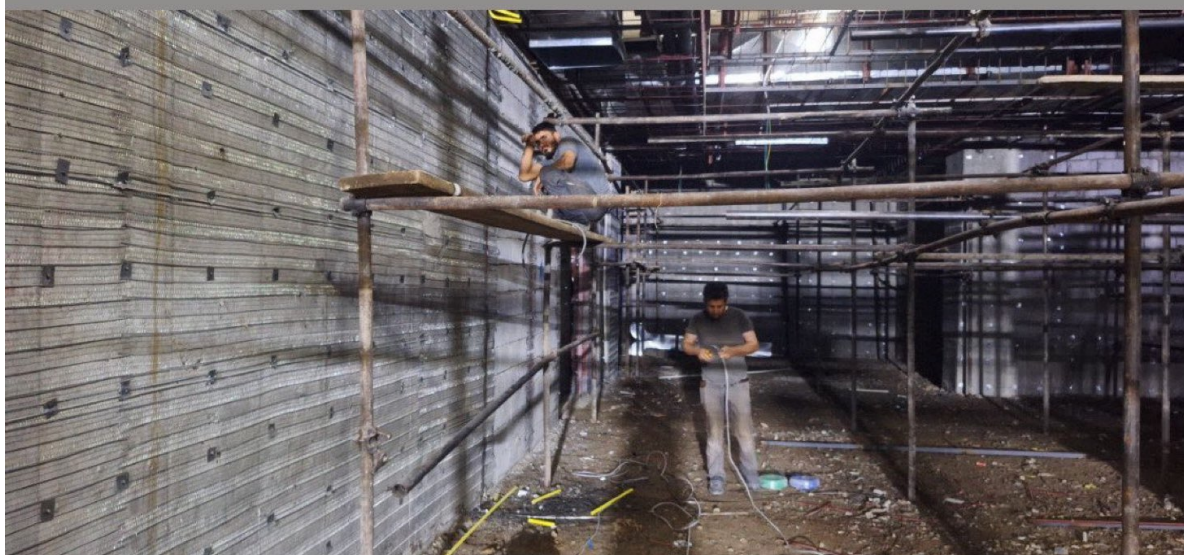

آماده سازی سازه سقف کاذب جهت نصب گچبرگ طبقه سوم بلوک B



جوشکاری شاسی آسانسور

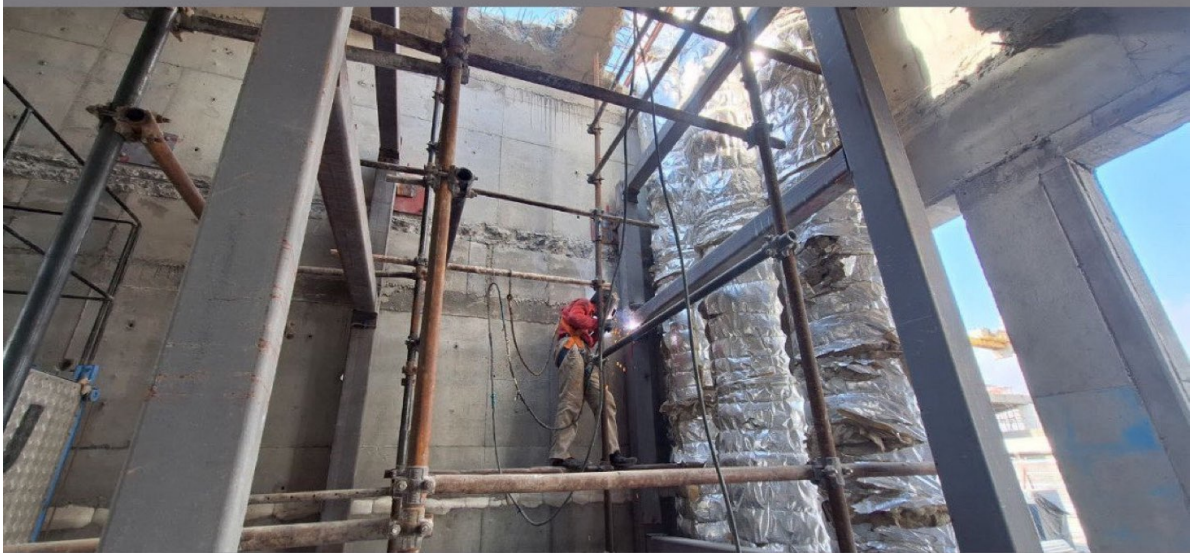

فن کویل و پلنیوم باکس سالن اجتماعات



اجرای سقف کاذب راه پله ها



اجرای سقف کاذب پارکینگ ۴-



اجرای لوله برق طبقه یازدهم بلوک C



ایزولاسیون آشپزخانه طبقه ۷-۸-۹ بلوک C



لوله برق طبقه یازدهم بلوک C



اجرای کاشی آشپزخانه طبقه ۶ بلوک C



اجرای گچ دیوار پارکینگ طبقه ۱-



نصب پنل گچبرگ سقف کاذب اتاقها طبقه سوم بلوک B



اجرای سازه سقف کاذب پارکینگ ۴ -



شیشه گذاری نمای غربی بلوک *B*



اجرای گچ بدنه پارکینگ طبقه ۱-



عایقکاری لوله های تاسیساتی رایزرها



بندکشی سنگ اسلب طبقه ۲ و ۳ بلوک C



اجرای کاشی آشپزخانه طبقه ششم بلوک C



تیغه چینی راهرو ارتباطی طبقه ۵ -



انتقال سنگ اسلب طبقه ششم و هفتم بلوک B



عایق کاری لوله ها طبقه همکف



انتقال گچ برک سقف کاذب به طبقات



اجرای سنگ کف پارکینگ طبقه ۱-



اجرای کاشی آشپزخانه طبقه ۷ بلوک B



نصب گچ برگ سقف کاذب طبقه ۲ بلوک C



نصب گچ برگ سقف کاذب طبقه سوم بلوک C



اجرای سینی برق موتورخانه



اجرای سقف کاذب سالن اجتماعات



انتقال سنگ اسلب طبقه ۸ بلوک B



اجرای لوله برق طبقه ۱۲ بلوک C



اجرای شاسی سقف کاذب
رمپ پارکینگ طبقه ۴ - به ۳ -
بلوک B



اجرای وال پست طبقه ۱۶ بلوک C



اجرای سینی برق موتورخانه



اجرای سنگ کف پارکینگ طبقه ۱ - بلوک C



اجرای رویه نمای جنوبی بلوک B



اجرای کاشی آشپزخانه طبقه ۶ بلوک B



اجرای کاشی آشپزخانه طبقه ۷ بلوک B



اجرای سازه سقف کاذب طبقه ۱۱ بلوک C



اجرای رویه نمای جنوبی بلوک B



اجرای رابیتس سقف سالن اجتماعات



اجرای سازه سقف کاذب طبقه ۱۱ بلوک C



اجرای کاشی آشپزخانه طبقه ۹ بلوک B



ورود و تخلیه پنجره ها



اجرای کاشی آشپزخانه طبقه ۶ بلوک C



اجرای سنگ اسلب طبقه ۶ بلوک C



اجرای لوله برق طبقه ۱۲ بلوک C



اتمام اجرای رابیتس سقف سالن اجتماعات

